



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1_DATA: 23/11/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

RUA UMIRI, 781 - CONJUNTO MACURANY - PARINTINS/AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1_DATA: 23/11/2022



FOTO 1 - escavação de vala para vigas baldrame



FOTO 2 - vista panorâmica onde serão construídas três salas (licitação, RH e financeiro)



FOTO 3 - gabarito e escavação das valas



FOTO 4 - armadura (arranque dos pilares)



FOTO 5 - vista panorâmica da escavação das valas



FOTO 6 - gabarito da obra

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1_DATA: 23/11/2022



FOTO 7 - área onde será ampliado (sala de transmissão e acessoria)



FOTO 8 - preparação para concretagem das brocas (arranque de pilares)



FOTO 9 - detalhe de broca concretada com armadura



FOTO 10 - vista panorâmica onde será ampliação (acréscimo de duas salas)



FOTO 11 - vista panorâmica área ampliação



FOTO 12 - preparação escavação de vala para viga baldrame


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1_DATA: 23/11/2022



FOTO 13 - estoque de armadura para utilização em vigas



FOTO 14 -



FOTO 15 - areia e seixo estocado no estacionamento

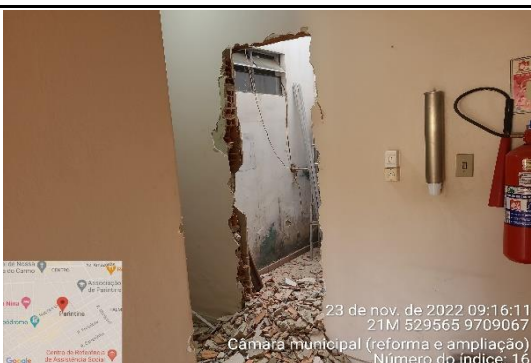


FOTO 16 - abertura de vão executado para novo banheiro



FOTO 17 - vão a ser fechado



FOTO 18 - abertura de vão para novo banheiro executado


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 1_DATA: 23/11/2022

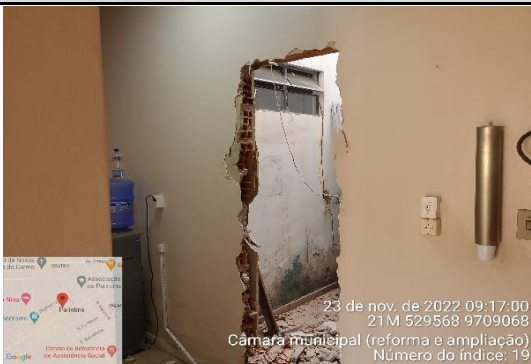


FOTO 19 - vão aberto para novo banheiro



FOTO 20 - vão a ser fechado



FOTO 21 - sala com remoção do piso cerâmico antigo



FOTO 22 - área onde será a nova fossa séptica

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

CONCLUSÃO VISTORIA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - nº 1 (23/11/2022)

Na data de 23/11/2022 quarta-feira, foi realizada vistoria técnica de fiscalização na obra de Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Parintins. Estava presente nesta vistoria eu (Eng. Diego César, fiscal responsável pela obra), a engenheira Myreya (responsável execução) e colaboradores da empresa.

Conforme relatório fotográfico realizado, concluímos que a obra teve seu início na semana passada, e as intervenções desenvolvidas no momento são: escavação de brocas, escavação do solo para posterior concretagem das sapatas, escavação de valas para vigas baldrame, demolição de vãos, etc.

RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR ENGº DIEGO CESAR (FISCAL RESPONSÁVEL DA OBRA) EM 23/11/2022 QUARTA-FEIRA as 12:51.

Diego Eduardo César

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 2608913008 AM

Fiscal / Semosp



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 2_DATA: 30/11/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

RUA UMIRI, 781 - CONJUNTO MACURANY - PARINTINS/AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 2_DATA: 30/11/2022



FOTO 1 - placa da obra

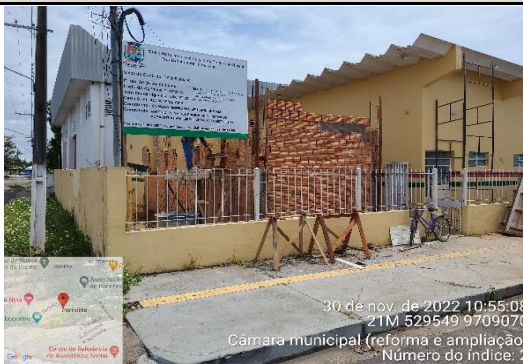


FOTO 2 - vista panorâmica obra (acréscimo salas)



FOTO 3 - vista interna onde serão acrescentadas três salas



FOTO 4 - vista panorâmica interna (assentamento da alvenaria)



FOTO 5 - assentamento da alvenaria em andamento



FOTO 6 - corredor

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 2_DATA: 30/11/2022



FOTO 7 - área onde será locada a nova fossa séptica



FOTO 8 - escavação para nova fossa séptica



FOTO 9 - detalhe (abertura vãos para esquadrias)



FOTO 10 - detalhe de armadura de pilar



FOTO 11 - vão fechado, conforme projeto



FOTO 12 - vão fechado (vista interna)


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 2_DATA: 30/11/2022



FOTO 13 - vão aberto para porta de novo banheiro



FOTO 14 - escavação para passagem de tubulação sanitária)



FOTO 15 - alvenaria lateral concluída onde teremos ampliação com acréscimo de duas salas (transmissão e assessoria)



FOTO 16 - viga baldrame



FOTO 17 - vista externa (nova alvenaria de fechamento) ampliação lateral



FOTO 18 - escavação de solo para nova fossa séptica em andamento


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 2_ DATA: 30/11/2022



FOTO 19 - início da demolição do forro do plenário



FOTO 20 - retirada de carpete do plenário



FOTO 21 - vista panorâmica do plenário (retirada de forro e carpete)



FOTO 22 - necessária retirada de equipamentos (ar condicionado e roteador)



FOTO 23 - forro removido



FOTO 24 - retirada de piso antigo

Este documento foi assinado digitalmente por CLEBIO CAMILO DE SOUSA em 22/12/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce-am.gov.br/spece> e informe o código: 6809F-C66-096B769B-9F766456-2CD71AC8


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 3_DATA: 02/12/2022



FOTO 25 - retirada manual de piso antigo



FOTO 26 - piso antigo sendo retirado



FOTO 27 - retirada do piso antigo (interior da câmara)

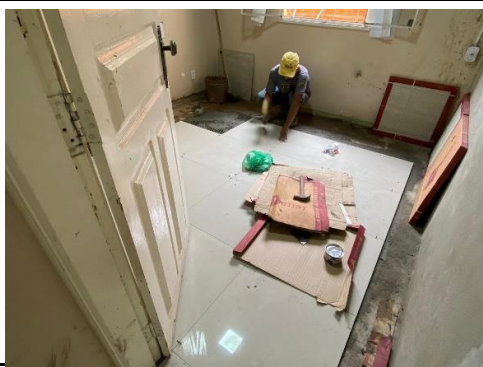


FOTO 28 - colaborador assentando novo piso porcelanato

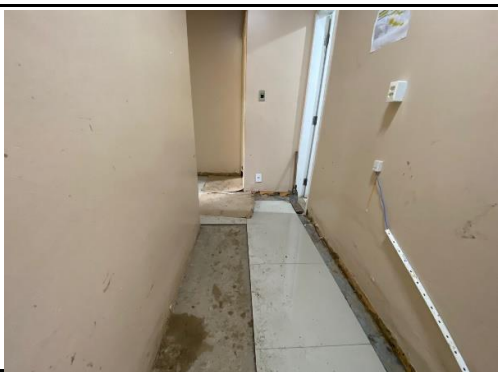


FOTO 29 - assentamento do novo piso porcelanato em andamento (corredor)



FOTO 30 - assentamento do novo piso porcelanato em andamento (sala espera/recepção)

Este documento foi assinado digitalmente por CLEBIO CAMILO DE SOUSA em 22/12/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce-am.gov.br/spede> e informe o código: 6809FC66-096B769B-9F766456-2CD71AC8

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 3_DATA: 02/12/2022



FOTO 30 - assentamento do novo piso porcelanato concluído (salas internas)



FOTO 31 - assentamento do novo piso porcelanato concluído (salas internas)




FOTO 32 - assentamento do novo piso porcelanato concluído (salas internas)



FOTO 33 - assentamento do novo piso porcelanato concluído (salas internas)



FOTO 34 - assentamento do novo piso porcelanato concluído (cozinha)



Este documento foi assinado digitalmente por CLEBIO CAMILO DE SOUSA em 22/12/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce-am.gov.br/spede> e informe o código: 6809F-C66-096B769B-9F766456-2CD71AC8


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

CONCLUSÃO VISTORIA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - nº 2 (30/11/2022)

Na data de 30/11/2022 quarta-feira, foi realizada vistoria técnica de fiscalização na obra de Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Parintins. Estava presente nesta vistoria eu (Eng. Diego César, fiscal responsável pela obra), a engenheira Myreya (responsável execução) e colaboradores da empresa.

Conforme relatório fotográfico realizado, segue resumo das intervenções desenvolvidas: concretagem de sapatas, brocas, viga baldrame e pilares; assentamento de tijolos (alvenaria); demolição do forro, demolição/retirada do piso antigo, retirada do carpete antigo do plenário, retirada de mobiliário do saguão para receber intervenções, etc

RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR ENGº DIEGO CESAR (FISCAL RESPONSÁVEL DA OBRA) EM 30/11/2022 QUARTA-FEIRA as 13:21.

Diego Eduardo César

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 2608913008 AM

Fiscal / Semosp



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 3_DATA: 02/12/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

RUA UMIRI, 781 - CONJUNTO MACURANY - PARINTINS/AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 3_DATA: 02/12/2022



FOTO 1 - vigas superiores concretadas



FOTO 2 - fôrma de viga superior concretada



FOTO 3 - vista externa novo ambiente de três salas. Alvenaria e concretagem dos elementos estruturais concluído



FOTO 4 - vista interna de novo ambiente de três salas. Reboco em andamento



FOTO 5 - interior da câmara cômodos reformados. Instalação de piso porcelanato concluído



FOTO 6 - sala reformada com novo piso e tratamento das paredes

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 3_DATA: 02/12/2022



FOTO 7 - interior de sala com novo piso



FOTO 8 - tratamento das paredes nas salas internas da câmara



FOTO 9 - nova alvenaria de fechamento (lateral câmara)



FOTO 10 - demolição de esquadrias antigas para adequação e conformidade com o novo projeto



FOTO 11 - vão fechado, conforme projeto



FOTO 12 - vão fechado (vista interna)


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 3_DATA: 02/12/2022



FOTO 13 - demolição de esquadrias antiga



FOTO 14 - execução de novo forro de gesso do plenário



FOTO 15 - execução de novo forro de gesso do saguão

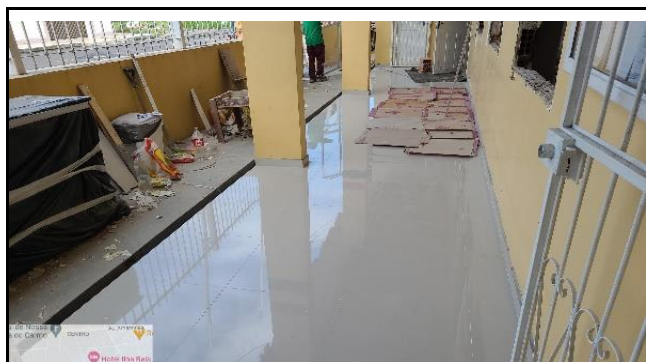


FOTO 16 - instalação de piso (porcelanato) área externa



FOTO 17 - salas com antigo piso retirados



FOTO 18 - vista panorâmica do plenário com emassamento do novo forro executado

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 3_DATA: 02/12/2022



FOTO 19 - vista panorâmica do saguão



FOTO 20 - novo forro executado recepção câmara



FOTO 21 - retirada das esquadrias antigas para dar lugar as novas esquadrias que serão instaladas



FOTO 22 - estacionamento da câmara, utilizado para armazenar mobiliário



FOTO 23 - novo local da fossa séptica já escavado




Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

CONCLUSÃO VISTORIA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - nº 3 (02/12/2022)

Na data de 02/12/2022 sexta-feira, foi realizada vistoria técnica de fiscalização na obra de Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Parintins. Estava presente nesta vistoria eu (Eng. Diego César, fiscal responsável pela obra, a engenheira Myreya (responsável execução) e colaboradores da empresa.

Conforme relatório fotográfico realizado, segue resumo das intervenções desenvolvidas: concretagem de pilares e vigas da ampliação, conclusão do fechamento lateral; instalação de novo forro e conclusão do assentamento do novo piso porcelanato, etc

RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR ENGº DIEGO CESAR (FISCAL RESPONSÁVEL DA OBRA) EM 02/12/2022 SEXTA-FEIRA as 09:16.

Diego Eduardo César

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 2608913008 AM

Fiscal / Semosp



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 4 _DATA: 20/12/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

RUA UMIRI, 781 - CONJUNTO MACURANY - PARINTINS/AM


Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 4 DATA: 20/12/2022



FOTO 1 - fachada câmara em fase final de pintura



FOTO 2 - nova sala (ampliação)



FOTO 3 - nova sala (ampliação) vista externa



FOTO 4 - nova fossa séptica



FOTO 5 - nova sala (ampliação) lateral da câmara



FOTO 6 - reparo em nova sala

Este documento foi assinado digitalmente por CLEBIO CAMILO DE SOUSA em 22/12/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce-am.gov.br/spede> e informe o código: 6809F-C66-096B769B-9F766456-2CD71AC8

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 4 _DATA: 20/12/2022



FOTO 7 - vista interna de novo banheiro



FOTO 8 - vista panorâmica salão nobre - pintura, forro de gesso e luminárias concluídos

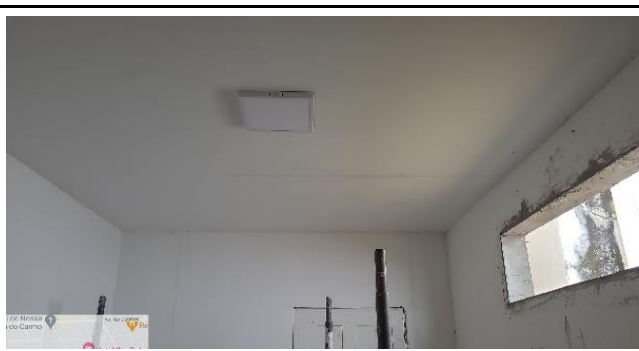


FOTO 9 - nova sala com forro de gesso concluído



FOTO 10 - nova sala (ampliação) com novo piso porcelanato instalado



FOTO 11 - fachada câmara - vãos prontos para receber as novas esquadrias



FOTO 12 - emassamento e pintura

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 4_ DATA: 20/12/2022



FOTO 13 - novo piso porcelanato instalado



FOTO 14 - fechamento de vão sala de arquivo

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

CONCLUSÃO VISTORIA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO - nº 4 (20/12/2022)

Na data de 20/12/2022 terça-feira, foi realizada vistoria técnica de fiscalização na obra de Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Parintins. Estava presente nesta vistoria eu (Eng. Diego César, fiscal responsável pela obra e colaboradores da empresa.

Conforme relatório fotográfico realizado, segue resumo das intervenções desenvolvidas: finalização da pintura e tratamento da fachada, pintura interna concluída, cobertura com telha galvalume instalado em áreas ampliadas.

RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR ENGº DIEGO CESAR (FISCAL RESPONSÁVEL DA OBRA) EM 20/12/2022 TERÇA-FEIRA as 09:16.

Diego Eduardo César

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 2608913008 AM

Fiscal / Semosp



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO FINAL DE FISCALIZAÇÃO Nº 5_DATA: 28/12/2022



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM

RUA UMIRI, 781 - CONJUNTO MACURANY - PARINTINS/AM

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 5 DATA: 28/12/2022



FOTO 1 - vista panorâmica do prédio da Câmara reformado



FOTO 2 - nova fachada



FOTO 3 - nova fachada da Câmara



FOTO 4 - fachada (elevação)



FOTO 5 - fachada e novas salas (externo)



FOTO 6 - vista panorâmica da ampliação (nova sala) em destaque as condensadoras dos aparelhos de ar condicionado

Este documento foi assinado digitalmente por CLEBIO CAMILO DE SOUSA em 22/12/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce-am.gov.br/speede> e informe o código: 6809F-C66-096B769B-9F766456-2CD71AC8

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 5_ DATA: 28/12/2022



FOTO 7 - calçada da câmara com nova pintura no piso inclusive piso tátil em amarelo



FOTO 8 - nova pintura da rampa destacando o pictograma universal PCD

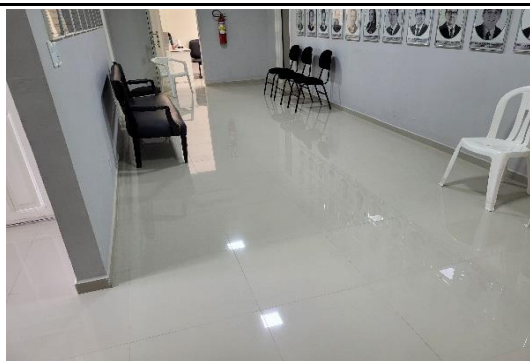


FOTO 9 - novo piso porcelanato instalado no salão nobre



FOTO 10 - execução de forro de gesso (salão nobre)



FOTO 11 - executado novo forro de PVC na cozinha



FOTO 12 - novo piso porcelanato na cozinha

Este documento foi assinado digitalmente por CLEBIO CAMILO DE SOUSA em 22/12/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce-am.gov.br/spece> e informe o código: 6809F-C66-096B769B-9F766456-2CD71AC8

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 5_ DATA: 28/12/2022

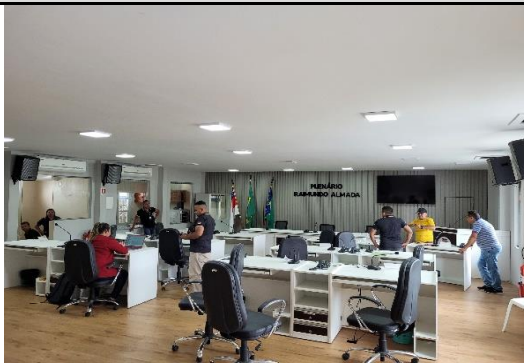


FOTO 14 - vista panorâmica do plenário com destaque para as novas luminárias



FOTO 15 - vista panorâmica do plenário com destaque para o novo forro de gesso



FOTO 16 - nova sala dos acessórios



FOTO 17 - forro de gesso executado em nova sala dos acessórios

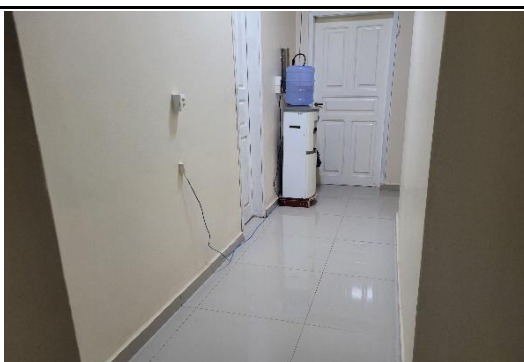


FOTO 18 - corredore das salas internas

Este documento foi assinado digitalmente por CLEBIO CAMILO DE SOUSA em 22/12/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce-am.gov.br/spede> e informe o código: 6809F-C66-096B769B-9F766456-2CD71AC8

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS-AM**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE FISCALIZAÇÃO Nº 5_DATA: 28/12/2022



FOTO 19 - pintura de portas patrimônio e controladoria



FOTO 20 - sala cerimonial e ata



FOTO 21 - nova sala arquivo



FOTO 22 - novo corredor (ampliação)

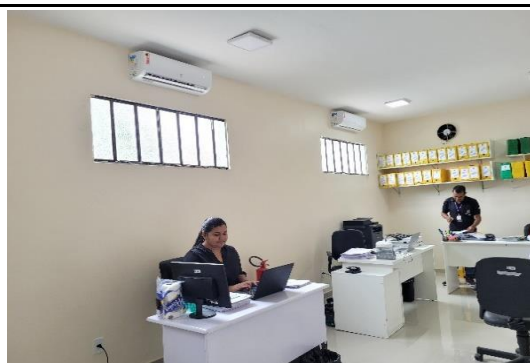


FOTO 23 - nova sala (RH/Financeiro)

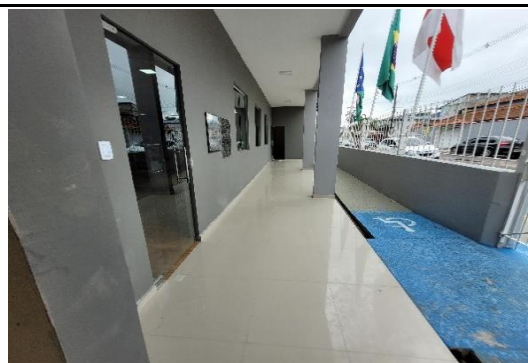


FOTO 24 - porta de acesso ao plenário (externo)

Este documento foi assinado digitalmente por CLEBIO CAMILO DE SOUSA em 22/12/2023.
Para conferência acesse o site <http://consulta.tce-am.gov.br/spepe> e informe o código: 6809F-C66-096B769B-9F766456-2CD71AC8

Diego Eduardo César
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - AM 2608913008



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

CONCLUSÃO VISTORIA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO FINAL - nº 5 (28/12/2023)

Na data de 28/12/2022 quarta-feira, foi realizada vistoria técnica de fiscalização na obra de Reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Parintins. Estava presente nesta vistoria eu (Eng. Diego César, fiscal responsável pela obra, colaboradores da empresa e colaboradores da Câmara Municipal.

Conforme relatório fotográfico realizado, segue resumo : este relatório é o final, pois a inauguração da Câmara Municipal de Parintins (Reforma e ampliação) acontecerá no dia 30/12/2022. Concluído a fachada, salas internas e ar condicionado.

RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR ENGº DIEGO CESAR (FISCAL RESPONSÁVEL DA OBRA) EM 28/12/2022 QUARTA-FEIRA as 09:49.

Diego Eduardo César

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 2608913008 AM

Fiscal / Semosp



Estado do Amazonas
Câmara Municipal de Parintins/AM
Rua Umiri, Nº 781 – Conjunto Macurany – CEP: 69.151-420

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Informo que a obra de Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal de Parintins **foram executados serviços a mais do que o contratado**, dentre eles destacamos:

- ✓ execução do forro de gesso da sala da presidência
- ✓ instalação do piso porcelanato na sala de arquivo
- ✓ execução de nova estrutura para caixa d'água
- ✓ pintura da calçada externa e corredor interno
- ✓ recuperação do piso de garagem
- ✓ execução de nova calçada (fundos/tubulação nova fossa)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE REFENTE AO PISO VINÍLICO

- ✓ Em relação ao piso vinílico a empresa irá fazer uma declaração informando que no momento da retirada do forro de lambri para a execução do novo forro de gesso, os colaboradores da empresa danificaram/estragaram o carpete existente do plenário. Como foi um dano causado pela própria empresa, a mesma refez o piso do plenário substituindo algumas folhas de compensado e também substituindo o carpete por um piso superior (piso vinílico), já que eles tinham o material no estoque, uma vez que os danos foram ocasionados pela própria empresa. Portanto informo que houve uma melhoria do plenário, instalando um piso superior em função do estrago/dano que foi ocasionado pelos colaboradores da empresa de forma involuntária no momento de remover o forro.

Diego Eduardo César

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 2608913008 AM

Fiscal / Semosp
